Studio Nx

구현 계획 — 3단계 목록 & 간트차트

2026-10-01

Studio Nx — 구현 계획 (3단계 · 간트차트)

항목	내용
기준 문서	PRD 00~06, DB.md, 채택된 AI 제안
작성일	2026-10-01 (AI 제안 채택 반영 개정)
시작일(가정)	2026-10-12 (월)
일정 가정	**1인 개발**, 주당 약 30시간, JS·백엔드 직접 구현 + 학습 시간 포함. 실제 진행 속도에 맞춰 매 단계 끝에 재조정

---

1. 단계 나누는 기준

PRD의 Phase는 **기능 묶음**이고, 이 문서의 단계는 **구현 순서**입니다.

1. **MVP 우선** — "혼자 곡을 만들고 WAV로 내보낼 수 있다"를 가장 먼저 완성합니다.
2. **나중에 바꾸기 어려운 데이터 구조는 1단계에서 확정** — MIDI 노트를 처음부터 **패턴**에 저장하고, 마스터를 **MASTER 트랙**으로 만들어 둡니다. UI(링크 복제·런처·오토메이션)는 뒤에 붙여도 DB 이전이 필요 없습니다.
3. **작곡에 꼭 필요한 기능과 차별화 기능은 2단계** — 오토메이션·녹음·스케일 도우미·템플릿·UI 커스터마이징, 그리고 AI 레퍼런스 분석·악기 분리.
4. **협업과 경험 요소는 3단계** — 실시간 협업(코멘트·스냅샷·잠금 포함), Nyxi 캐릭터·도우미·튜토리얼, 클립 런처.

단계	목표	기간(예상)	마일스톤
1단계 — MVP	혼자 곡 만들기 → 저장 → WAV 출력 (+ 회귀 테스트 기반)	2026-10-12 ~ 2027-02-07 (17주)	**v0.1 MVP** (2027-02-08)
2단계 — 작곡 완성도 · 차별화	패처, MIDI 장치, 오토메이션, 스케일·코드, 녹음, MP3/FLAC, 용량 관리, 링크 클립·템플릿, UI 커스터마이징·커맨드 팔레트, 로컬 캐시, **AI 레퍼런스 분석**, **악기 분리**	2027-02-08 ~ 2027-07-18 (23주)	**v0.2** (2027-07-19)
3단계 — 협업 · 경험	**실시간 협업 + 톡방 + 잠금·코멘트·스냅샷**, **Nyxi 캐릭터 연동·도우미·팁·튜토리얼**, 클립 런처, 확장 기능	2027-07-19 ~ 2027-11-30 (19주)	**v1.0** (2027-12-01)

---

2. 1단계 — MVP

> 완료 조건: 회원가입 → 프로젝트 생성 → 샘플 드롭·피아노롤 입력 → 신스·이펙트(체인 뷰) → 저장/불러오기 → **WAV 출력**까지 한 사람이 끝까지 할 수 있고, 오디오 회귀 테스트가 돌아간다.

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S1-01	개발 환경·폴더 구조, FastAPI 뼈대, MySQL `studionx` 생성, **Sentry 연동**(오류 + 기본 성능 지표)	00 §5, §7	1주	최상

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S1-02	Phase 1 테이블 + 인증 API (회원가입·로그인·JWT·리프레시)	01 FR-101~108	2주	최상
S1-03	페이지 HTML/CSS 6종 + **테마 CSS 변수 체계**(다크/라이트 전환 대비)	01 §6, 02 FR-2162	2주 (S1-02와 병행)	최상
S1-04	회원정보 수정·탈퇴, 문의, 프로젝트 CRUD (생성 시 **MASTER 트랙 자동 생성**)	01 FR-111~126	1주	상
S1-05	오디오 엔진 기초: AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러(tick/PPQ 960), 메트로놈, 루프	02 FR-201~205	2주	최상
S1-06	타임라인: 트랙 추가/순서/삭제, 클립 이동·길이·복제·분할, 스냅, 줌	02 FR-206~210	2주	최상
S1-07	샘플 드래그앤드롭 업로드, 라이브러리 패널, 파형, 태그, **업로드 용량 확인**	02 FR-221~227	1.5주	최상
S1-08	트랙 아코디언 틀 + [노트] 탭 피아노롤 (노트는 **패턴**에 저장)	02 FR-231~~233~~, ~~261~~262, 2131	2주	최상
S1-09	기본 악기(Synth, Sampler) + 이펙트(EQ, Comp, Reverb) + 체인 뷰 + **Nyxi 디바이스 카드 + 상세 설정 모달**(`param_schema` 자동 생성, 아트는 플레이스홀더) + 트랙 헤더 믹서·마스터 트랙	02 FR-241~~252~~, ~~263~~264, 2181~2189	2.5주	최상
S1-10	프로젝트 전체 저장/불러오기(`/full`), 자동 저장, Undo/Redo(명령 레지스트리 기반)	02 FR-253~256, 2169	1주	최상
S1-11	WAV 출력 (OfflineAudioContext, 클라이언트 인코딩)	03 FR-301~303, 307	1주	최상
S1-12	**오디오 회귀 테스트 기반**: 테스트 프로젝트 3~5개 + 골든 WAV + 비교 스크립트	00 §7.1	1주	상
S1-13	MVP 안정화: 버그 수정, 브라우저 테스트, Sentry 오류 정리	—	1주	상

3. 2단계 — 작곡 완성도 · 차별화

> 완료 조건: 패처·오토메이션·녹음·스케일 도우미·링크 클립·템플릿(확인창)·UI 커스터마이징이 동작하고, MP3/FLAC 출력, **레퍼런스 분석 → 추천 적용**, **악기 분리 → 라이브러리 등록**이 된다.

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S2-01	Web MIDI 실시간 연주·녹음, 화면 건반/PC 키보드 입력	02 FR-234~236, 238	1.5주	상
S2-02	**패처 뷰**: 노드·연결선·병렬·연결선 게인, 순환 검사, 체인⇄패처 전환	02 FR-265~269	2.5주	상
S2-03	마스터 디바이스(Limiter), Delay·Gain 추가, 프리셋 저장/불러오기	02 FR-243, 246, 252	1.5주	상
S2-04	**오토메이션 레인**: 레인·포인트 편집, 곡선, AudioParam 스케줄링, 출력 반영	02 FR-2101~2108	2주	최상

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S2-05	**스케일·코드 도우미**: 스케일 표시·스냅, 코드 스탬프, 다이아토닉 코드	02 FR-2111~2116	1주	상
S2-06	**오디오 녹음**: 입력 선택, 모니터링, 레이턴시 보정	02 FR-2121~2126	1.5주	상
S2-07	MP3/FLAC 서버 인코딩, `export_jobs` 진행률, 출력 이력, 라이브러리에 추가	03 FR-304~314	1.5주	상
S2-08	**저장 용량·AI 사용량 관리**: 대시보드 위젯, 용량 정리 화면, 자동 정리	01 §4.4	1주	상
S2-09	**링크 클립 UI**(링크/독립 복제, 고유하게 만들기) + **템플릿**(시스템·내 템플릿, **적용 전 확인창**)	02 FR-2132~~2134, 2141~~2145, 01 FR-127	1.5주	상
S2-10	**UI 커스터마이징**(테마·색·배율·레이아웃) + **단축키 설정** + **커맨드 팔레트** + 하단 패널 틀	02 FR-2161~~2170, FR-271~~275, 01 §4.5	2주	상
S2-11	**로컬 캐시**(OPFS/IndexedDB, LRU, 무효화)	02 FR-228~229	1주	중
S2-12	AI 분석 ①: 레퍼런스 파일 업로드 + 장르 태그, 특징 추출	05 FR-501~~502, 511~~515	2주	최상
S2-13	AI 분석 ②: 추천 4종(스키마 검증) + 미리듣기·적용·Undo + 레퍼런스 기반 새 프로젝트(확인창) + 사용량 한도	05 FR-521~~530, 551~~553	2주	최상
S2-14	**악기 분리**: 작업 큐·워커(Demucs 계열), stem → 샘플 등록, 용량 확인	04 전체	2주	상
S2-15	2단계 안정화 + 회귀 테스트 세트 확장(패처·오토메이션)	—	1주	상

4. 3단계 — 협업 · 경험

> 완료 조건: 초대한 멤버와 동시 편집·톡방·코멘트·트랙 잠금이 되고 스냅샷으로 복원할 수 있다. Nyxi(외부 제작 에셋)가 춤추고 도우미의 얼굴로 답하며, 상황 인지 팁을 주고 튜토리얼을 안내한다.

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S3-01	초대·수락·멤버 권한 관리, 공유받은 프로젝트 목록	06 FR-601~607	1.5주	상
S3-02	**실시간 동시 편집**: WebSocket, 연산 전송·검증·revision, LWW, 재접속 따라잡기 (오토메이션·패턴 연산 포함)	06 FR-611~620	3주	상
S3-03	Presence(접속자·선택영역) + **톡방(하단 패널)**	06 FR-631~647	1.5주	상
S3-04	**트랙 잠금·담당자**	06 FR-671~675	0.5주	상
S3-05	**타임라인 코멘트**: 핀, 답글, 해결, 사이드 패널, 멘션	06 FR-651~657	1.5주	상
S3-06	**버전 스냅샷**: 수동/자동, 미리듣기, 복원(협업 동기화), 복제, 보관 규칙	06 FR-661~669	2주	상
S3-07	**Nyxi 캐릭터 연동**: 외부 에셋(`manifest.json`) 로더, 플로팅 창, Fruity Dance식 BPM 동기 춤, 이벤트 반응, 상단바 아이콘, **카드 아트 교체**(플레이스홀더 → 외부 에셋)	02 FR-281~~290, 2181~~2183	1.5주	중

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S3-08	**Nyxi 도우미**: 대화·스트리밍, 프로젝트 문맥, 도움말 RAG, 액션 버튼(명령 레지스트리), 캐릭터 연동(생각 중·말풍선·빠른 질문)	05 FR-531~541	2주	중
S3-09	**Nyxi 팁(상황 인지)**: 팁 규칙 9종, 레벨·빈도 제한·조용한 모드, **프로젝트 5개 도달 시 유지 여부 확인창**	05 FR-561~569	1주	중
S3-10	**튜토리얼 모드**: 기본 코스 5단계, 동작 감지, 진행 저장	02 FR-2151~2155	1주	중
S3-11	**클립 런처(세션 뷰)**: 트랙×씬 격자, 퀀타이즈 런치	02 FR-2135, 2137	1.5주	중
S3-12	확장: 레퍼런스 링크 입력, 내 곡 vs 레퍼런스 비교, 사이드체인, `.mid` 가져오기, Drum Rack	05 FR-503~504, 529 / 02 FR-237, 242, 266	1.5주	하
S3-13	통합 테스트, 배포, 도움말 문서(`docs/help/`), AI 구현 설명 문서 정리	—	1주	상

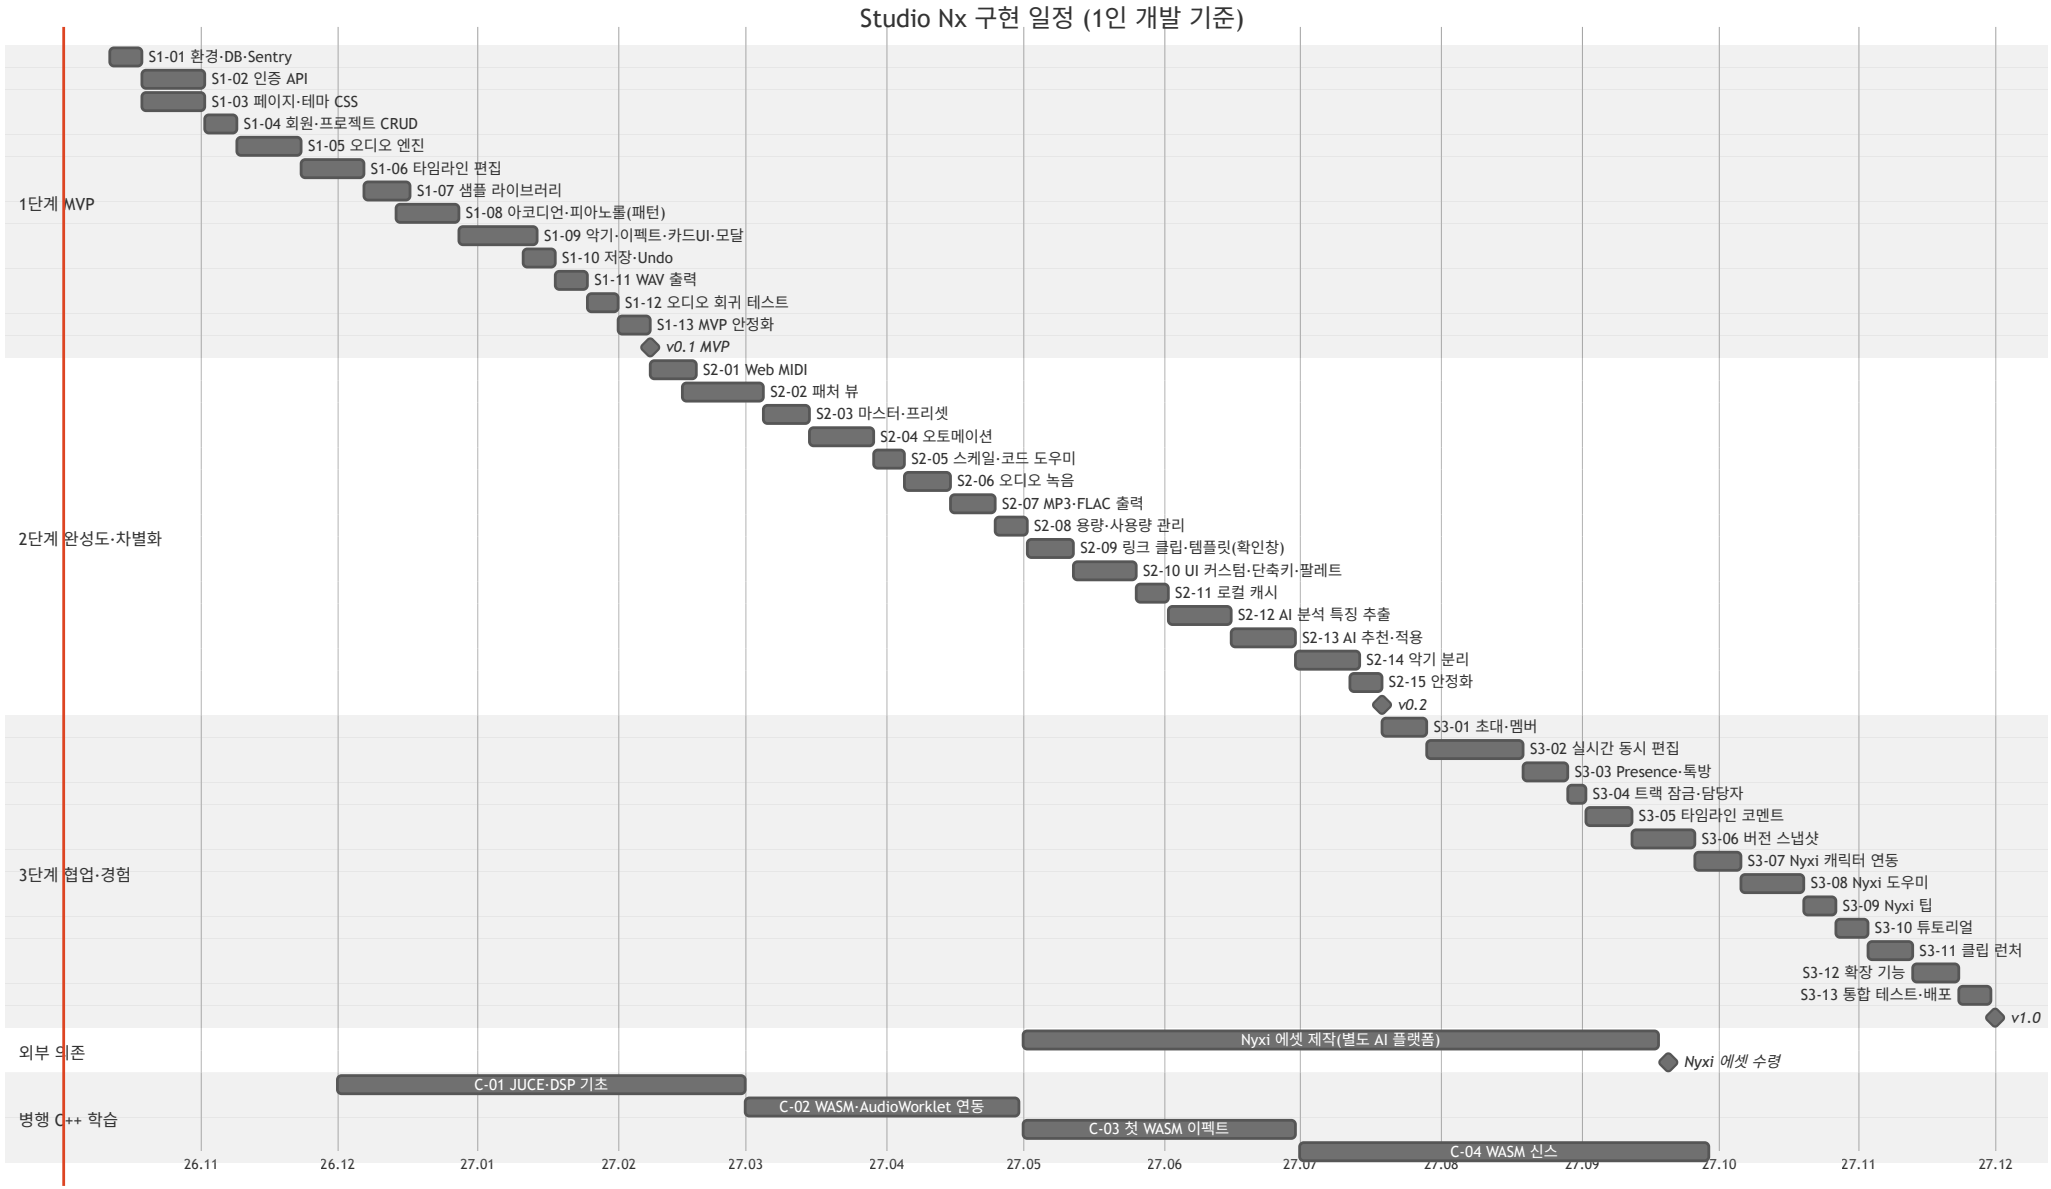
5. 병행 트랙 — C++ / JUCE → WASM (사용자 학습)

> 기획서 원칙상 C++ 구현은 사용자가 직접 합니다. 일정에 묶지 않고 **병행 학습 트랙**으로 둡니다.

ID	내용	시기(목표)
C-01	JUCE·DSP 기초 (Gain → Filter → Oscillator)	2026-12 ~ 2027-02
C-02	Emscripten 빌드 + AudioWorklet 연동 (PRD 02 §4.6 인터페이스)	2027-03 ~ 2027-04
C-03	첫 WASM 이펙트를 `engine='WASM'` 플러그인으로 등록, 회귀 테스트로 Web Audio 버전과 비교	2027-05 ~ 2027-06
C-04	WASM 신스 (기본 Synth 대체 또는 추가), 오토메이션 연동	2027-07 ~ 2027-09

---

6. 간트차트


Studio Nx 구현 일정 (1인 개발 기준)
1단계 MVP
S1-01 환경·DB·Sentry
S1-02 인증 API
S1-03 페이지·테마 CSS
S1-04 회원·프로젝트 CRUD
S1-05 오디오 엔진
S1-06 타임라인 편집
S1-07 샘플 라이브러리
S1-08 아코디언·피아노롤(패턴)
S1-09 악기·이펙트·카드UI·모달
S1-10 저장·Undo
S1-11 WAV 출력
S1-12 오디오 회귀 테스트
S1-13 MVP 안정화
v0.1 MVP
2단계 완성도·차별화
S2-01 Web MIDI
S2-02 패처 뷰
S2-03 마스터·프리셋
S2-04 오토메이션
S2-05 스케일·코드 도우미
S2-06 오디오 녹음
S2-07 MP3·FLAC 출력
S2-08 용량·사용량 관리
S2-09 링크 클립·템플릿(확인창)
S2-10 UI 커스텀·단축키·팔레트
S2-11 로컬 캐시
S2-12 AI 분석 특징 추출
S2-13 AI 추천·적용
S2-14 악기 분리
S2-15 안정화
v0.2
3단계 협업·경험
S3-01 초대·멤버
S3-02 실시간 동시 편집
S3-03 Presence·톡방
S3-04 트랙 잠금·담당자
S3-05 타임라인 코멘트
S3-06 버전 스냅샷
S3-07 Nyxi 캐릭터 연동
S3-08 Nyxi 도우미
S3-09 Nyxi 팁
S3-10 튜토리얼
S3-11 클립 런처
S3-12 확장 기능
S3-13 통합 테스트·배포
v1.0
외부 의존
Nyxi 에셋 제작(별도 AI 플랫폼)
Nyxi 에셋 수령
병행 C++ 학습
C-01 JUCE·DSP 기초
C-02 WASM·AudioWorklet 연동
C-03 첫 WASM 이펙트
C-04 WASM 신스
26.11
26.12
27.01
27.02
27.03
27.04
27.05
27.06
27.07
27.08
27.09
27.10
27.11
27.12

7. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
오디오 엔진(스케줄링·지연) 구현 난이도	1단계 지연	S1-05를 가장 먼저 프로토타입. lookahead scheduler 패턴 참고
패처·오토메이션·패턴이 Undo·저장·협업과 얽힘	2·3단계 버그	데이터 구조(패턴, MASTER 트랙, 연결선)를 1단계에 확정, 모든 편집을 **명령 레지스트리** 단위로 통일
소리가 조용히 바뀌는 회귀 버그	품질 저하	S1-12에서 골든 파일 테스트를 만들고 단계마다 테스트 세트 확장
녹음 레이턴시가 기기마다 다름	녹음 위치 어긋남	자동 측정 + 수동 보정값, 기기별 설정 저장
AI 추천 품질이 낮음	차별화 약화	규칙 기반 기본 추천을 먼저 만들고 LLM은 설명·보정 역할부터 시작
악기 분리·스냅샷으로 저장 용량 급증	운영 비용	S2-08 용량 관리를 분리·스냅샷보다 먼저 구현, 보관 규칙 자동화
실시간 협업 충돌 처리	3단계 지연	서버 순서화 + LWW + 트랙 잠금으로 충돌 자체를 줄임. CRDT는 필요할 때
1인 개발 일정 초과 (총 59주)	전체 지연	단계 끝마다 범위 재조정. S3-10~S3-12는 v1.0 이후로 미룰 수 있음
Nyxi 에셋(외부 AI 플랫폼 제작) 지연	S3-07 지연	1단계부터 **플레이스홀더 아트 + `manifest.json` 로더**로 개발해 에셋 없이도 전 기능 동작. 에셋 규격(PRD 02 FR-288)을 외부 제작 쪽에 미리 전달
